CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

POLÍTICA
URBANA

NOTA TÉCNICA
Nº 46/2026

Acompanhamento Orçamentário de Obras de Mobilidade Urbana em Belo Horizonte: execução e planejamento



Leilane de Moura Paegle; Pedro Araújo Castro;
Pedro Schettini

N 46.

câmarapublicações

DIRETORIA GERAL
Christian Aquino Cota

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO
Frederico Stefano de Oliveira Arrieiro

DIVISÃO DE CONSULTORIA LEGISLATIVA
Bruno Dias Lana

CAPA
Larissa Metzker
Gustavo Ziviani
Yasmin Schiess
Seção de Criação Visual
Superintendência de Comunicação Institucional

PESQUISA DE LEGISLAÇÃO
Divisão de Instrução e Pesquisa

AUTORIA
Leilane de Moura Paegle
Consultora Legislativa de Política Urbana
Pedro Araújo Castro
Consultor Legislativo de Orçamento e Finanças Públicas
Pedro Schettini Cunha
Administrador

CONTATO: divcol@cmbh.mg.gov.br
URL: www.cmbh.mg.gov.br/A-Camara/publicacoes

Conforme a Deliberação da Mesa Diretora nº 4, de 2026, compete à Divisão de Consultoria Legislativa, entre outras atividades, elaborar textos técnicos, artigos, relatórios e outras peças informativas, bem como prestar assessoramento técnico às comissões, à Mesa Diretora e aos vereadores. Todos os Estudos e Notas Técnicas são produzidos em atendimento a solicitação de vereadora, de vereador, de comissão ou da Mesa Diretora.

O conteúdo deste trabalho é de responsabilidade dos autores e não representa posicionamento oficial da Câmara Municipal de Belo Horizonte ou da sua Divisão de Consultoria Legislativa.

É permitida a reprodução deste texto e dos dados contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas.

Como citar este texto:
PAEGLE, Leilane de Moura; CASTRO, Pedro Araújo; CUNHA, Pedro Schettini. **Nota Técnica nº 46/2026**: Acompanhamento Orçamentário de Obras de Mobilidade Urbana em Belo Horizonte: execução e planejamento. Divisão de Consultoria Legislativa/Câmara Municipal de Belo Horizonte, novembro 2026. Disponível em: <www.cmbh.mg.gov.br/A-Camara/publicacoes>. Acesso em: DD mmm. AAAA.

POLÍTICA
URBANA

NOTA TÉCNICA
Nº 46/2026

Acompanhamento Orçamentário de Obras de Mobilidade Urbana em Belo Horizonte: execução e planejamento

N 46.

Leilane de Moura Paegle; Pedro Araújo Castro;
Pedro Schettini

Dados da Audiência Pública

Requerimento de Comissão nº 3464/2026

Finalidade da Audiência Pública: Debater as principais obras e intervenções de mobilidade urbana atualmente em execução ou planejamento em Belo Horizonte, seus objetivos, investimentos, cronogramas e resultados esperados para a mobilidade da cidade.

Comissão de Mobilidade Urbana, Indústria, Comércio e Serviços

Autoria do requerimento: Vereador Uner Augusto - PL

Data, horário e local: 19/11/2026, às 13:30h no Plenário Helvécio Arantes

1. Informações técnicas e orçamentárias sobre algumas das principais obras de mobilidade urbana em BH:

A seguir quadro sintético das obras/ações da Área de Mobilidade Urbana em Belo Horizonte (até o 2° quadrimestre de 2026) do maior valor orçado para o menor valor orçado:

Relatório Sintético Área de Mobilidade Urbana executado até 2° quadrimestre 2026 (PBH)

(do maior valor de ORÇADO para o menor valor ORÇADO)

A	E	G	H	I	K	M	N	O	P	Q	R
						Relatório Orçado e Executado - Sintético - ATÉ 2º quadrimestre 2026					
ÁREA DE	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	CÓD	PROGRAMA	AÇÃO	SUBAÇÃO	VALOR ORÇAD	CRÉDITO DIS	VALOR EMPE	VALOR LIQUID	VALOR PAGO
MOBILIDAD	TRANSPORTE	SERVIÇOS URBANOS	0060	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	Qualidade no Transporte	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR AO TRANSPORTE	796.069.000,00	796.069.000,00	739.522.515,61	555.051.179,31	555.051.179,31
MOBILIDAD	TRANSPORTE	SERVIÇOS URBANOS	0305	MODERNIZA MOBILIDADE -	Qualidade no Transporte	REFROTA - RENOVAÇÃO DE FROTA	318.665.295,00	318.665.295,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIDAD	TRANSPORTE	SERVIÇOS URBANOS	0060	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	Gestão da Política de	OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	224.002.875,00	224.002.875,00	167.059.224,11	138.993.796,98	129.076.788,05
MOBILIDAD	TRANSPORTE	SERVIÇOS URBANOS	0060	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	Gerenciamento da Mobilidade	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO MUNICIPAL E	139.520.746,00	143.917.568,98	68.703.173,35	43.905.660,24	41.725.415,20
MOBILIDAD	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA	0062	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO	IMPLANTAÇÃO E	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO,	133.294.532,00	152.050.730,37	41.096.241,38	27.872.362,30	26.455.862,71
MOBILIDAD	TRANSPORTE	SERVIÇOS URBANOS	0060	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	Gestão da Política de	GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTE URBANO E	65.552.710,00	73.426.599,52	54.683.531,52	38.171.007,10	35.772.659,75
MOBILIDAD	TRANSPORTE	SERVIÇOS URBANOS	0305	MODERNIZA MOBILIDADE -	Implantação de Intervenções	IMPLANTAÇÃO DE TRATAMENTO PRIORITÁRIO PARA	41.871.181,00	43.411.718,52	2.857.346,65	124.368,44	0,00
MOBILIDAD	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA	0311	NOVO ANEL RODOVIÁRIO -	INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO	OBRAS ESTRUTURANTES DO NOVO ANEL	25.533.792,00	20.802.452,54	8.593.783,83	4.767.749,64	4.767.749,64
MOBILIDAD	TRANSPORTE	SERVIÇOS URBANOS	0060	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	Gerenciamento da Mobilidade	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA	25.136.062,00	21.636.062,00	10.732.555,65	3.789.341,64	3.186.606,63
MOBILIDAD	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA	0062	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO	Obras Estruturantes do	OBRAS DIVERSAS DO SISTEMA VIÁRIO	13.347.595,00	5.968.484,95	3.082.169,58	823.010,74	773.557,77
MOBILIDAD	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA	0062	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO	IMPLANTAÇÃO E	INTERVENÇÕES URBANAS	13.103.993,00	28.289.722,65	7.953.865,12	5.800.378,46	5.800.378,46
MOBILIDAD	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA	0062	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO	Obras Estruturantes do	OBRAS NAS INTERSEÇÕES DA AVENIDA CRISTIANO	11.655.299,00	94.076.050,97	81.273.739,03	45.383.107,83	45.383.107,83
MOBILIDAD	TRANSPORTE	SERVIÇOS URBANOS	0060	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	Gestão da Política de	OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	10.733.343,00	10.547.343,00	5.797.638,24	4.632.120,75	4.189.317,73
MOBILIDAD	HABITAÇÃO	HABITAÇÃO URBANA	0311	NOVO ANEL RODOVIÁRIO -	INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO	OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA BR 381/NORTE -	10.273.600,00	10.273.600,00	169.207,27	69.200,77	69.200,77
MOBILIDAD	TRANSPORTE	SERVIÇOS URBANOS	0060	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	Melhoria da Mobilidade	ESTACIONAMENTO ROTATIVO - MANUTENÇÃO DO	8.490.688,00	8.490.688,00	4.948.692,00	3.847.783,50	3.587.760,00
MOBILIDAD	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA	0311	NOVO ANEL RODOVIÁRIO -	INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO	REFORMA DAS PASSARELAS DO NOVO ANEL	6.550.000,00	2.428.293,50	757.342,53	121.081,01	121.081,01
MOBILIDAD	GESTÃO AMBIENTAL	PRESERVAÇÃO E	0062	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO	OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO	OBRAS DA ESTAÇÃO MOVE	6.266.124,00	6.266.124,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIDAD	TRANSPORTE	SERVIÇOS URBANOS	0311	NOVO ANEL RODOVIÁRIO -	Gerenciamento da Mobilidade	GESTÃO E OPERAÇÃO DO ANEL RODOVIÁRIO	5.896.800,00	5.896.800,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIDAD	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA	0062	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO	IMPLANTAÇÃO E	E. - LOA 248/2026 - PPA 37/2026	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIDAD	TRANSPORTE	SERVIÇOS URBANOS	0060	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	Gerenciamento da Mobilidade	MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DO BRT/MOVE	2.879.560,00	2.879.560,00	2.126.856,82	1.480.212,94	1.298.841,29
MOBILIDAD	TRANSPORTE	SERVIÇOS URBANOS	0060	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	Gestão da Política de	GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTE URBANO E	2.815.622,00	2.956.622,00	2.198.300,24	1.537.242,75	1.509.342,71
MOBILIDAD	TRANSPORTE	SERVIÇOS URBANOS	0311	NOVO ANEL RODOVIÁRIO -	Gerenciamento da Mobilidade	GESTÃO E OPERAÇÃO DO ANEL RODOVIÁRIO	2.278.000,00	2.252.500,00	979,19	979,19	979,19
MOBILIDAD	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA	0305	MODERNIZA MOBILIDADE -	Obras Estruturantes do	IMPLANTAÇÃO DO BRT AMAZONAS	2.153.079,00	16.080.483,61	12.828.332,56	3.122.219,12	3.122.219,12
MOBILIDAD	TRANSPORTE	SERVIÇOS URBANOS	0060	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	Gestão da Política de	MODERNIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIDAD	TRANSPORTE	SERVIÇOS URBANOS	0060	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	Gestão da Política de	OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	1.818.000,00	1.668.207,00	212.725,00	176.225,00	175.585,00
MOBILIDAD	HABITAÇÃO	HABITAÇÃO URBANA	0062	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO	Obras Estruturantes do	VIA 710 - REASSENTAMENTOS E INDENIZAÇÕES	1.748.216,00	2.358.216,00	669.605,43	386.805,43	386.805,43
MOBILIDAD	TRANSPORTE	SERVIÇOS URBANOS	0060	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	Gestão da Política de	GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTE URBANO E	1.712.681,00	1.778.681,00	964.071,39	953.599,99	790.727,26
MOBILIDAD	TRANSPORTE	SERVIÇOS URBANOS	0060	GESTÃO DA MOBILIDADE URBAN	Transporte Seguro e Suster	PROJETO VIDA NO TRÂNSITO - IMPLANTAÇÃO	1598971	1598971	612224,98	612224,98	535250,68

Fonte: Portal da Transparência PBH

câmarapublicações

Listagem das principais OBRAS em Mobilidade Urbana por ordem de MAIORES ORÇAMENTOS (considerando busca por obras):

Fonte: Portal da Transparência PBH, Relatório Comparativo do Orçamento

(1) Obras estruturantes do anel rodoviário – R$25.533.792,00;

(2) Obras diversas do sistema viário – R$13.347.595,00;

(3) Obras nas intersecções da Avenida Cristiano Machado – R$ 11.655.299,00;

(4) Obras de duplicação da BR381/Norte (reassentamento e indenizações) – R$ 10.273.600,00;

(5) Reforma das passarelas do Novo Anel Rodoviário - R$ 6.550.000,00;

(6) Obras da Estação Move – R$ 6.266.124,00.

Relatório Sintético Área de Mobilidade executado até 2° quadrimestre 2026 (PBH)
(do maior valor PAGO para o menor valor PAGO.)

ÁREA DE	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	CÓD	PROGRAMA	AÇÃO	SUBAÇÃO	VALOR ORÇAD	CRÉDITO DIS	VALOR EMPE	VALOR LIQUIDA	VALOR PAGO
MOBILIDAD	TRANSPORTE	SERVIÇOS URBANOS	0060	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	Qualidade no Transporte	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR AO TRANSPORTE	796.069.000,00	796.069.000,00	739.522.515,61	555.051.179,31	555.051.179,31
MOBILIDAD	TRANSPORTE	SERVIÇOS URBANOS	0060	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	Gestão da Política de	OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	224.002.875,00	224.002.875,00	167.059.224,11	138.993.796,98	129.076.788,05
MOBILIDAD	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA	0062	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO	Obras Estruturantes do	OBRAS NAS INTERSEÇÕES DA AVENIDA CRISTIANO	11.655.299,00	94.076.050,97	81.273.739,03	45.383.107,83	45.383.107,83
MOBILIDAD	TRANSPORTE	SERVIÇOS URBANOS	0060	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	Gerenciamento da Mobilidade	GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO MUNICIPAL E	139.520.746,00	143.917.568,98	68.703.173,35	43.905.660,24	41.725.415,20
MOBILIDAD	TRANSPORTE	SERVIÇOS URBANOS	0060	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	Gestão da Política de	GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTE URBANO E	65.552.710,00	73.426.599,52	54.683.531,52	38.171.007,10	35.772.659,75
MOBILIDAD	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA	0062	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO	IMPLANTAÇÃO E	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO,	133.294.532,00	152.050.730,37	41.096.241,38	27.872.362,30	26.455.862,71
MOBILIDAD	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA	0062	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO	IMPLANTAÇÃO E	INTERVENÇÕES URBANAS	13.103.993,00	28.289.722,65	7.953.865,12	5.800.378,46	5.800.378,46
MOBILIDAD	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA	0311	NOVO ANEL RODOVIÁRIO -	INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO	OBRAS ESTRUTURANTES DO NOVO ANEL	25.533.792,00	20.802.452,54	8.593.783,83	4.767.749,64	4.767.749,64
MOBILIDAD	TRANSPORTE	SERVIÇOS URBANOS	0060	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	Gestão da Política de	OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	10.733.343,00	10.547.343,00	5.797.638,24	4.632.120,75	4.189.317,73
MOBILIDAD	TRANSPORTE	SERVIÇOS URBANOS	0060	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	Melhoria da Mobilidade	ESTACIONAMENTO ROTATIVO - MANUTENÇÃO DO	8.490.688,00	8.490.688,00	4.948.692,00	3.847.783,50	3.587.760,00
MOBILIDAD	TRANSPORTE	SERVIÇOS URBANOS	0060	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	Gerenciamento da Mobilidade	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA	25.136.062,00	21.636.062,00	10.732.555,65	3.789.341,64	3.186.606,63
MOBILIDAD	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA	0305	MODERNIZA MOBILIDADE -	Obras Estruturantes do	IMPLANTAÇÃO DO BRT AMAZONAS	2.153.079,00	16.080.483,61	12.828.332,56	3.122.219,12	3.122.219,12
MOBILIDAD	TRANSPORTE	SERVIÇOS URBANOS	0060	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	Gestão da Política de	GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTE URBANO E	2.815.622,00	2.956.622,00	2.198.300,24	1.537.242,75	1.509.342,71
MOBILIDAD	TRANSPORTE	SERVIÇOS URBANOS	0060	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	Gerenciamento da Mobilidade	MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DO BRT/MOVE	2.879.560,00	2.879.560,00	2.126.856,82	1.480.212,94	1.298.841,29
MOBILIDAD	TRANSPORTE	SERVIÇOS URBANOS	0060	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	Gestão da Política de	GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTE URBANO E	1.712.681,00	1.778.681,00	964.071,39	933.599,99	790.727,26
MOBILIDAD	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA	0062	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO	Obras Estruturantes do	OBRAS DIVERSAS DO SISTEMA VIÁRIO	13.347.595,00	5.968.484,95	3.082.169,58	823.010,74	773.557,77
MOBILIDAD	TRANSPORTE	SERVIÇOS URBANOS	0060	GESTÃO DA MOBILIDADE URBAN	Transporte Seguro e Suster	PROJETO VIDA NO TRÂNSITO - IMPLANTAÇÃO	1598971	1598971	612224,98	612224,98	535250,68
MOBILIDAD	HABITAÇÃO	HABITAÇÃO URBANA	0062	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO	Obras Estruturantes do	VIA 710 - REASSENTAMENTOS E INDENIZAÇÕES	1.748.216,00	2.358.216,00	669.605,43	386.805,43	386.805,43
MOBILIDAD	TRANSPORTE	SERVIÇOS URBANOS	0060	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	Gestão da Política de	OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	1.818.000,00	1.668.207,00	212.725,00	176.225,00	175.585,00
MOBILIDAD	TRANSPORTE	SERVIÇOS URBANOS	0060	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	Gerenciamento da Mobilidade	E. I. - LOA 1174/2025	0,00	175.203,15	175.203,15	174.866,02	174.866,02
MOBILIDAD	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA	0062	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO	Obras Estruturantes do	VIA 710 - 2ª ETAPA	0,00	249.139,00	249.138,73	171.108,63	171.108,63
MOBILIDAD	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA	0311	NOVO ANEL RODOVIÁRIO -	INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO	REFORMA DAS PASSARELAS DO NOVO ANEL	6.550.000,00	2.428.293,50	757.342,53	121.081,01	121.081,01
MOBILIDAD	TRANSPORTE	SERVIÇOS URBANOS	0060	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	Gerenciamento da Mobilidade	E. I. - LOA 1372/2026	0,00	100.000,00	100.000,00	99.396,21	99.396,21
MOBILIDAD	HABITAÇÃO	HABITAÇÃO URBANA	0311	NOVO ANEL RODOVIÁRIO -	INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO	OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA BR 381/NORTE -	10.273.600,00	10.273.600,00	169.207,27	69.200,77	69.200,77
MOBILIDAD	TRANSPORTE	SERVIÇOS URBANOS	0311	NOVO ANEL RODOVIÁRIO -	Gerenciamento da Mobilidade	GESTÃO E OPERAÇÃO DO ANEL RODOVIÁRIO	2.278.000,00	2.252.500,00	979,19	979,19	979,19
MOBILIDAD	TRANSPORTE	SERVIÇOS URBANOS	0060	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	Gestão da Política de	MODERNIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES	368.130,00	371.281,00	804,00	804,00	804,00
MOBILIDAD	TRANSPORTE	SERVIÇOS URBANOS	0305	MODERNIZA MOBILIDADE -	Qualidade no Transporte	REFROTA - RENOVAÇÃO DE FROTA	318.665.295,00	318.665.295,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIDAD	TRANSPORTE	SERVIÇOS URBANOS	0305	MODERNIZA MOBILIDADE -	Implantação de Intervenções	IMPLANTAÇÃO DE TRATAMENTO PRIORITÁRIO PARA	41.871.181,00	43.411.718,52	2.857.346,65	124.368,44	0,00
MOBILIDAD	GESTÃO AMBIENTAL	PRESERVAÇÃO E	0062	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO	OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO	OBRAS DA ESTAÇÃO MOVE	6.266.124,00	6.266.124,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIDAD	TRANSPORTE	SERVIÇOS URBANOS	0311	NOVO ANEL RODOVIÁRIO -	Gerenciamento da Mobilidade	GESTÃO E OPERAÇÃO DO ANEL RODOVIÁRIO	5.896.800,00	5.896.800,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIDAD	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA	0062	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO	IMPLANTAÇÃO E	E. - LOA 248/2026 - PPA 37/2026	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIDAD	TRANSPORTE	SERVIÇOS URBANOS	0060	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	Gestão da Política de	MODERNIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIDAD	URBANISMO	INFRA-ESTRUTURA	0311	NOVO ANEL RODOVIÁRIO -	MANUTENÇÃO E	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO,	1.230.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Portal da Transparência PBH

Listagem das mesmas principais OBRAS acima por ordem de MAIORES pagamentos (considerando busca por obras):

Fonte: Portal da Transparência PBH

(1) Obras nas intersecções da Avenida Cristiano Machado – R$ 45.383.107,83;

(2) Obras estruturantes do anel rodoviário – R$ 4.767.749,64;

(3) Obras diversas do sistema viário – R$ 773.557,77;

(4) Reforma das passarelas do Novo Anel Rodoviário - R$ 121.081,01;

(5) Obras de duplicação da BR381/Norte (reassentamento e indenizações) – R$ 69.200,77;

(6) Obras da Estação Move – R$ 00,00.

Detalhamento de alguns orçamentos aproximados por expressões de busca:

(Busca por) **Anel Rodoviário:**

RELATORIO MOBILIDADE ORÇADO E EXECUTADO - Sintético - ATÉ 2º quadrimestre 2026

	FUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	SUBAÇÃO	VALOR ORÇA	CRÉDITO DISI	VALOR EMPI	VALOR LIQUIDAI	VALOR PAGO
363	TRANSPORTE	MODERNIZA MOBILIDADE -	Implantação de Intervenções para Priorização do	IMPLANTAÇÃO DE TRATAMENTO PRIORITÁRIO PARA O TRANSPORTE COLETIVO	41.871.181,00	43.411.718,52	2.857.346,65	124.368,44	0,00
364	URBANISMO	NOVO ANEL RODOVIÁRIO -	INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO NOVO ANEL RODOVIÁRIO	OBRAS ESTRUTURANTES DO NOVO ANEL RODOVIÁRIO	25.533.792,00	20.802.452,54	8.593.783,83	4.767.749,64	4.767.749,64
365	TRANSPORTE	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	Gerenciamento da Mobilidade Urbana Municipal	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA MOBILIDADE	25.136.062,00	21.636.062,00	10.732.555,65	3.789.341,64	3.186.606,63
366	URBANISMO	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	Obras Estruturantes do Sistema Viário	OBRAS DIVERSAS DO SISTEMA VIÁRIO	13.347.595,00	5.968.484,95	3.082.169,58	823.010,74	773.557,77
367	URBANISMO	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	IMPLANTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	INTERVENÇÕES URBANAS	13.103.993,00	28.289.722,65	7.953.865,12	5.800.378,46	5.800.378,46
368	URBANISMO	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	Obras Estruturantes do Sistema Viário	OBRAS NAS INTERSEÇÕES DA AVENIDA CRISTIANO MACHADO	11.655.299,00	94.076.050,97	81.273.739,03	45.383.107,83	45.383.107,83
369	TRANSPORTE	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	Gestão da Política de Transporte Urbano e Trânsito	OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	10.733.343,00	10.547.343,00	5.797.638,24	4.632.120,75	4.189.317,73
370	HABITAÇÃO	NOVO ANEL RODOVIÁRIO -	INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO NOVO ANEL RODOVIÁRIO	OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA BR 381/NORTE - REASSENTAMENTOS E INDENIZAÇÕES	10.273.600,00	10.273.600,00	169.207,27	69.200,77	69.200,77
371	TRANSPORTE	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	Melhoria da Mobilidade	ESTACIONAMENTO ROTATIVO - MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO	8.490.688,00	8.490.688,00	4.948.692,00	3.847.783,50	3.587.760,00
372	URBANISMO	NOVO ANEL RODOVIÁRIO -	INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO NOVO ANEL RODOVIÁRIO	REFORMA DAS PASSARELAS DO NOVO ANEL RODOVIÁRIO	6.550.000,00	2.428.293,50	757.342,53	121.081,01	121.081,01
949	GESTÃO	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA	OBRAS DA ESTAÇÃO MOVE	6.266.124,00	6.266.124,00	0,00	0,00	0,00
950	TRANSPORTE	NOVO ANEL RODOVIÁRIO -	Gerenciamento da Mobilidade Urbana Municipal	GESTÃO E OPERAÇÃO DO ANEL RODOVIÁRIO	5.896.800,00	5.896.800,00	0,00	0,00	0,00
951	URBANISMO	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	IMPLANTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	E. - LOA 248/2026 - PPA 37/2026	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
952	TRANSPORTE	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	Gerenciamento da Mobilidade Urbana Municipal	MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DO BRT/MOVE	2.879.560,00	2.879.560,00	2.126.856,82	1.480.212,94	1.298.841,29
953	TRANSPORTE	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	Gestão da Política de Transporte Urbano e Trânsito	GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTE URBANO E TRÂNSITO	2.815.622,00	2.956.622,00	2.198.300,24	1.537.242,75	1.509.342,71
954	TRANSPORTE	NOVO ANEL RODOVIÁRIO -	Gerenciamento da Mobilidade Urbana Municipal	GESTÃO E OPERAÇÃO DO ANEL RODOVIÁRIO	2.278.000,00	2.252.500,00	979,19	979,19	979,19
955	URBANISMO	MODERNIZA MOBILIDADE -	Obras Estruturantes do Sistema Viário	IMPLANTAÇÃO DO BRT AMAZONAS	2.153.079,00	16.080.483,61	12.828.332,56	3.122.219,12	3.122.219,12
956	TRANSPORTE	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	Gestão da Política de Transporte Urbano e Trânsito	MODERNIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
957	TRANSPORTE	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	Gestão da Política de Transporte Urbano e Trânsito	OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	1.818.000,00	1.668.207,00	212.725,00	176.225,00	175.585,00
958	HABITAÇÃO	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	Obras Estruturantes do Sistema Viário	VIA 710 - REASSENTAMENTOS E INDENIZAÇÕES	1.748.216,00	2.358.216,00	669.605,43	386.805,43	386.805,43
959	TRANSPORTE	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	Gestão da Política de Transporte Urbano e Trânsito	GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTE URBANO E TRÂNSITO	1.712.681,00	1.778.681,00	964.071,39	953.599,99	790.727,26
960	TRANSPORTE	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	Transporte Seguro e Sustentável	PROJETO VIDA NO TRÂNSITO - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE EDUCAÇÃO PARA A	1598971	1598971	612224,98	612224,98	535250,68
573	URBANISMO	NOVO ANEL RODOVIÁRIO -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO NOVO ANEL	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS	1.230.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
574	URBANISMO	NOVO ANEL RODOVIÁRIO -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO NOVO ANEL	REFORMA E MANUTENÇÃO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM OAE NO NOVO ANEL	1.230.000,00	69.667,00	39.666,28	0,00	0,00
577	URBANISMO	NOVO ANEL RODOVIÁRIO -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO NOVO ANEL	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS NO NOVO ANEL RODOVIÁRIO	1.230.000,00	152.000,00	122.000,00	0,00	0,00
578	URBANISMO	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	IMPLANTAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	AÇÕES EMERGENCIAIS	819.583,00	324.828,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Área de Mobilidade executado até 2° quadrimestre 2026 (PBH) org. SECCAF/DIVCOL

(Busca por) **Avenida Amazonas:**

	RELATORIO MOBILIDADE ORÇADO E EXECUTADO - Sintético - ATÉ 2º quadrimestre 2026								
	FUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	SUBAÇÃO	VALOR ORÇA	CRÉDITO DISI	VALOR EMPE	VALOR LIQUIDA	VALOR PAGO
55	URBANISMO	MODERNIZA MOBILIDADE -	Obras Estruturantes do Sistema Viário	IMPLANTAÇÃO DO BRT AMAZONAS	2.153.079,00	16.080.483,61	12.828.332,56	3.122.219,12	3.122.219,12
47	TRANSPORTE	MODERNIZA MOBILIDADE -	Implantação de Intervenções para Priorização do	MOBILIDADE URBANA - CORREDOR AMAZONAS	983,00	983,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Área de Mobilidade executado até 2° quadrimestre 2026 (PBH) org. SECCAF/DIVCOL


(Busca por) **Avenida Cristiano Machado**

	RELATORIO MOBILIDADE ORÇADO E EXECUTADO - Sintético - ATÉ 2º quadrimestre 2026								
	FUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	SUBAÇÃO	VALOR ORÇA	CRÉDITO DISI	VALOR EMPE	VALOR LIQUIDAI	VALOR PAGO
8	URBANISMO	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	Obras Estruturantes do Sistema Viário	OBRAS NAS INTERSEÇÕES DA AVENIDA CRISTIANO MACHADO	11.655.299,00	94.076.050,97	81.273.739,03	45.383.107,83	45.383.107,83


Fonte: Área de Mobilidade executado até 2° quadrimestre 2026 (PBH) org. SECCAF/DIVCOL

Segundo Site Painel de Obras Públicas (PBH):


(Busca por) **Anel Rodoviário**

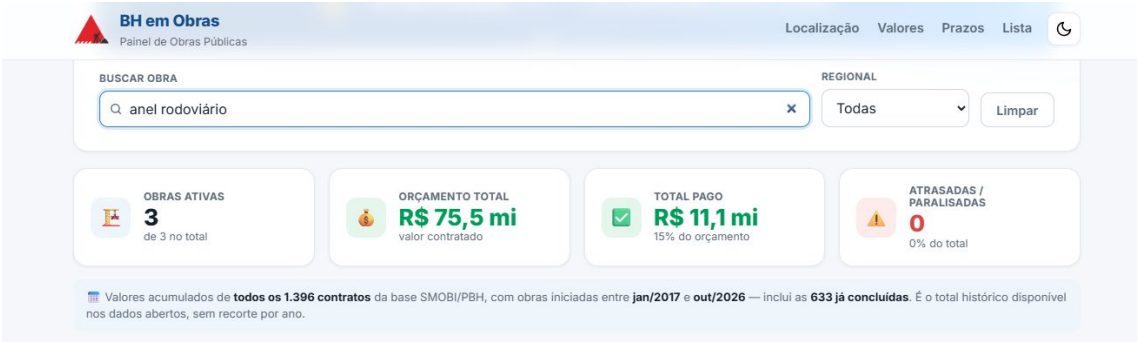



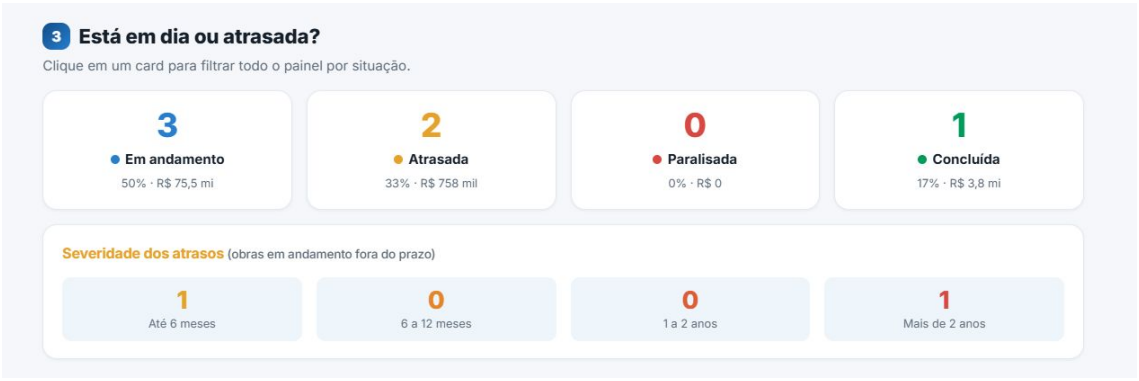


continua

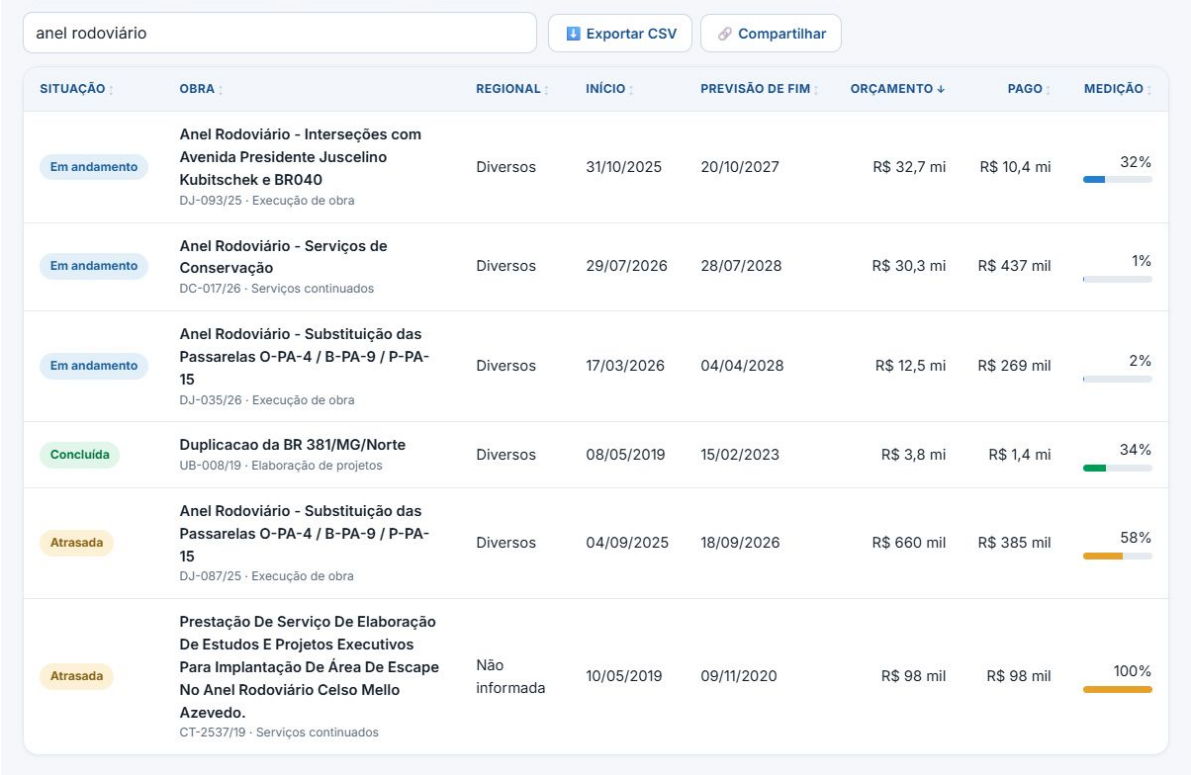

SITUAÇÃO	OBRA	REGIONAL	INÍCIO	PREVISÃO DE FIM	ORÇAMENTO	PAGO	MEDIÇÃO
Em andamento	Anel Rodoviário - Interseções com Avenida Presidente Juscelino Kubitschek e BR040 DJ-093/25 · Execução de obra	Diversos	31/10/2025	20/10/2027	R$ 32,7 mi	R$ 10,4 mi	32%
Em andamento	Anel Rodoviário - Serviços de Conservação DC-017/26 · Serviços continuados	Diversos	29/07/2026	28/07/2028	R$ 30,3 mi	R$ 437 mil	1%
Em andamento	Anel Rodoviário - Substituição das Passarelas O-PA-4 / B-PA-9 / P-PA-15 DJ-035/26 · Execução de obra	Diversos	17/03/2026	04/04/2028	R$ 12,5 mi	R$ 269 mil	2%
Concluída	Duplicacao da BR 381/MG/Norte UB-008/19 · Elaboração de projetos	Diversos	08/05/2019	15/02/2023	R$ 3,8 mi	R$ 1,4 mi	34%
Atrasada	Anel Rodoviário - Substituição das Passarelas O-PA-4 / B-PA-9 / P-PA-15 DJ-087/25 · Execução de obra	Diversos	04/09/2025	18/09/2026	R$ 660 mil	R$ 385 mil	58%
Atrasada	Prestação De Serviço De Elaboração De Estudos E Projetos Executivos Para Implantação De Área De Escape No Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo. CT-2537/19 · Serviços continuados	Não informada	10/05/2019	09/11/2020	R$ 98 mil	R$ 98 mil	100%

Fonte: BH em Obras - painel de obras públicas.


(Busca por) **Avenida Amazonas**

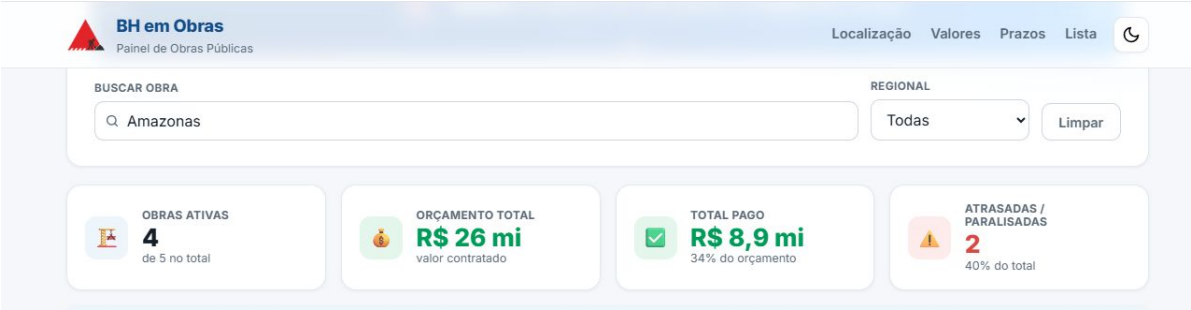




continua



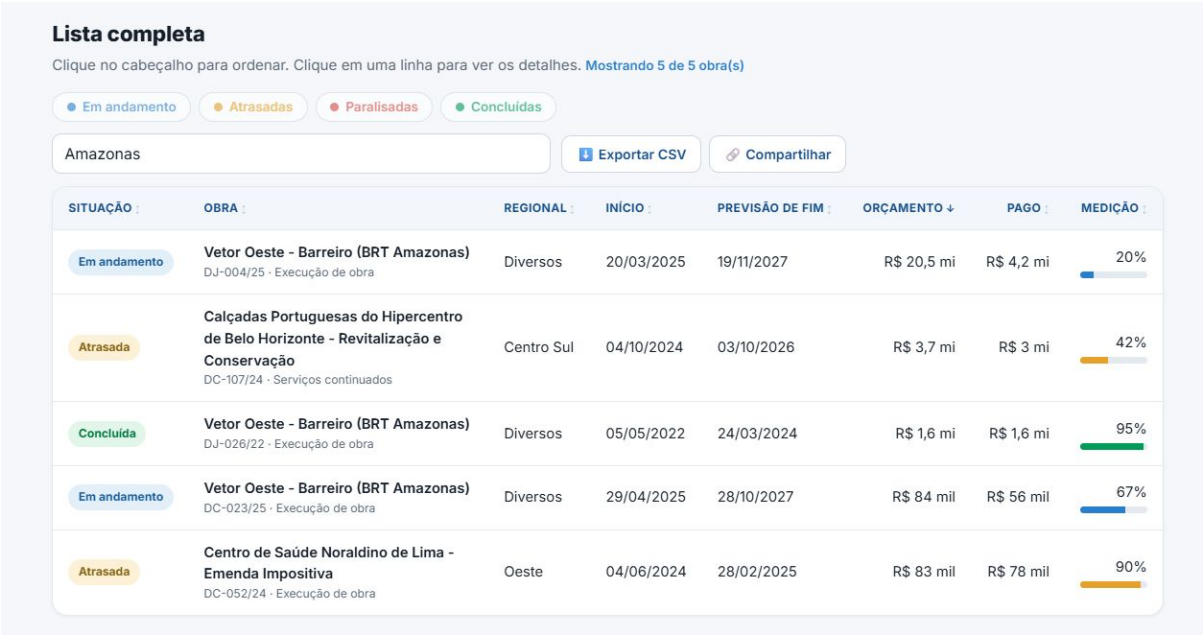


Fonte: BH em Obras - painel de obras públicas.

(Busca por) **Av. Cristiano Machado:**

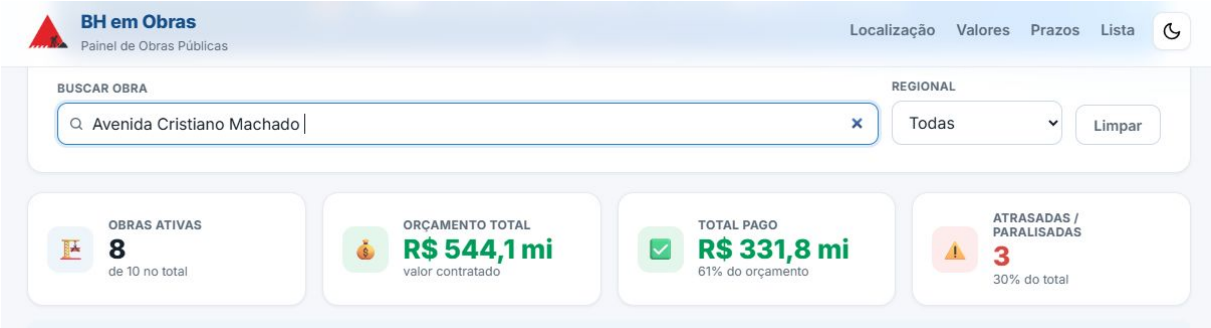

continua

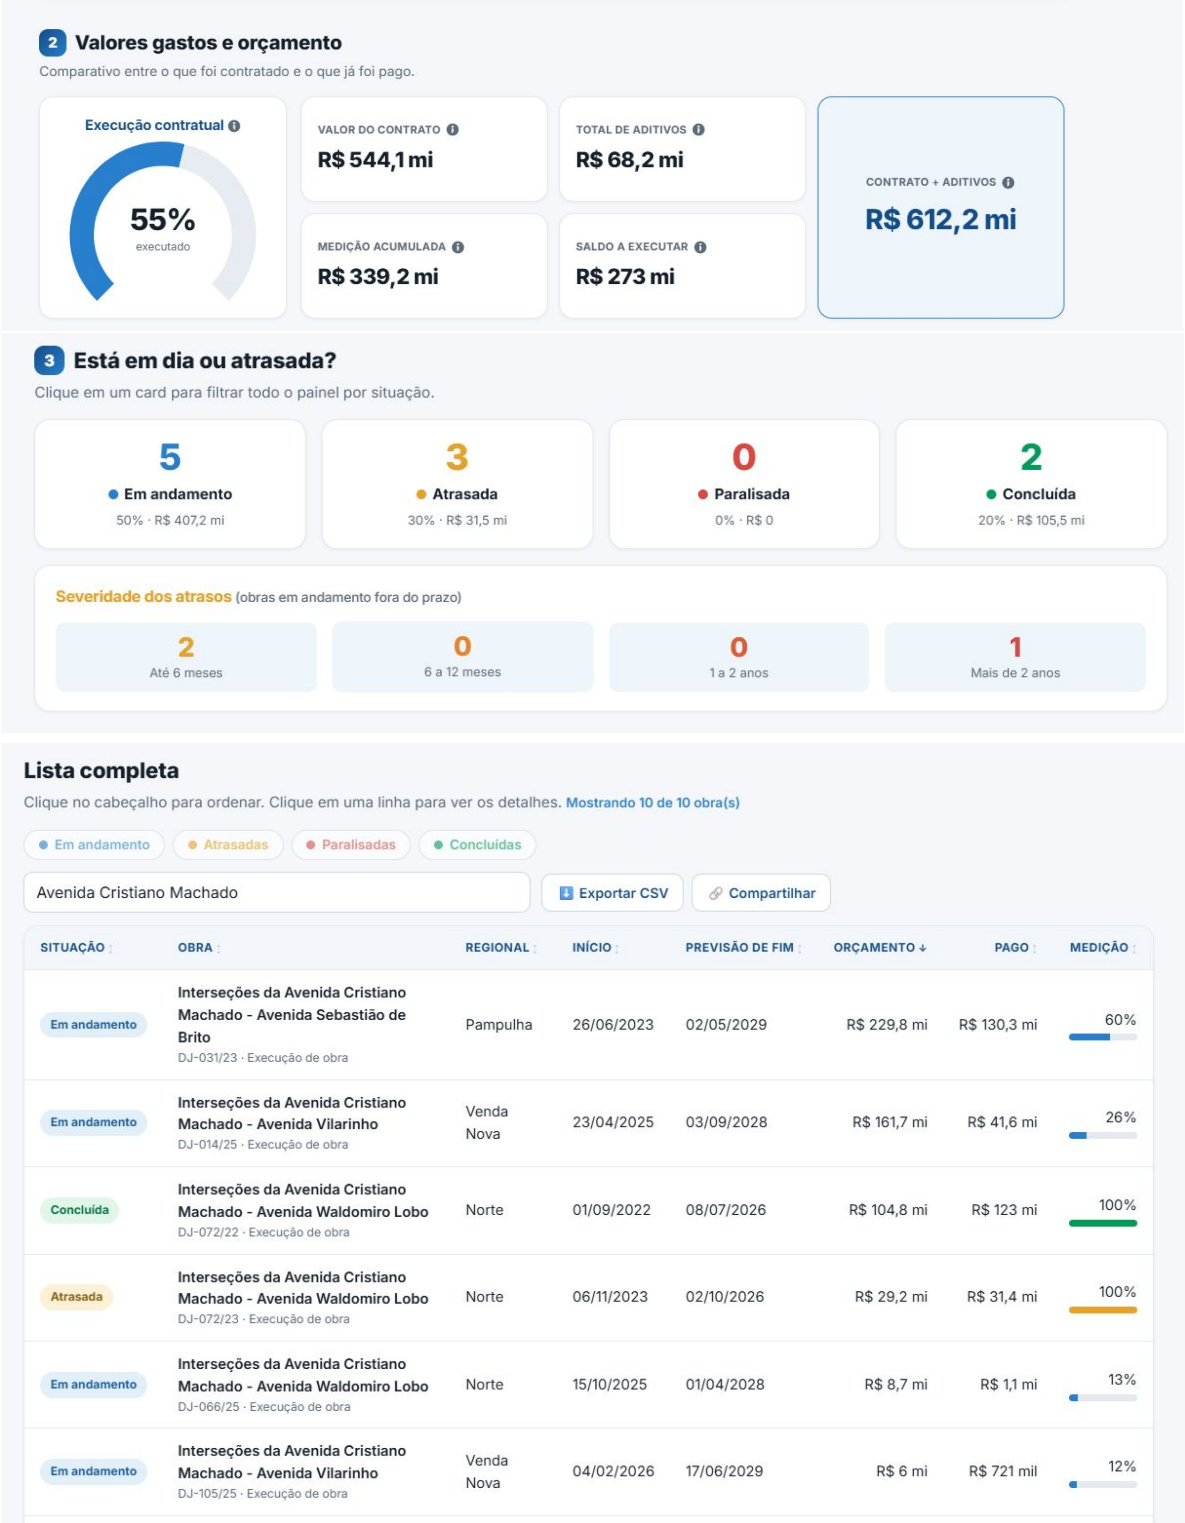

2 Valores gastos e orçamento

Comparativo entre o que foi contratado e o que já foi pago.

Execução contratual

55%
executado

VALOR DO CONTRATO
R$ 544,1 mi

TOTAL DE ADITIVOS
R$ 68,2 mi

CONTRATO + ADITIVOS
R$ 612,2 mi

MEDIÇÃO ACUMULADA
R$ 339,2 mi

SALDO A EXECUTAR
R$ 273 mi

3 Está em dia ou atrasada?

Clique em um card para filtrar todo o painel por situação.

5	3	0	2
Em andamento	Atrasada	Paralisada	Concluída
50% · R$ 407,2 mi	30% · R$ 31,5 mi	0% · R$ 0	20% · R$ 105,5 mi

Severidade dos atrasos (obras em andamento fora do prazo)

2	0	0	1
Até 6 meses	6 a 12 meses	1 a 2 anos	Mais de 2 anos

Lista completa


Clique no cabeçalho para ordenar. Clique em uma linha para ver os detalhes. Mostrando 10 de 10 obra(s)

Em andamento · Atrasadas · Paralisadas · Concluídas

Avenida Cristiano Machado · Exportar CSV · Compartilhar

SITUAÇÃO	OBRA	REGIONAL	INÍCIO	PREVISÃO DE FIM	ORÇAMENTO ↓	PAGO	MEDIÇÃO
Em andamento	Interseções da Avenida Cristiano Machado - Avenida Sebastião de Brito DJ-031/23 · Execução de obra	Pampulha	26/06/2023	02/05/2029	R$ 229,8 mi	R$ 130,3 mi	60%
Em andamento	Interseções da Avenida Cristiano Machado - Avenida Vilarinho DJ-014/25 · Execução de obra	Venda Nova	23/04/2025	03/09/2028	R$ 161,7 mi	R$ 41,6 mi	26%
Concluída	Interseções da Avenida Cristiano Machado - Avenida Waldomiro Lobo DJ-072/22 · Execução de obra	Norte	01/09/2022	08/07/2026	R$ 104,8 mi	R$ 123 mi	100%
Atrasada	Interseções da Avenida Cristiano Machado - Avenida Waldomiro Lobo DJ-072/23 · Execução de obra	Norte	06/11/2023	02/10/2026	R$ 29,2 mi	R$ 31,4 mi	100%
Em andamento	Interseções da Avenida Cristiano Machado - Avenida Waldomiro Lobo DJ-066/25 · Execução de obra	Norte	15/10/2025	01/04/2028	R$ 8,7 mi	R$ 1,1 mi	13%
Em andamento	Interseções da Avenida Cristiano Machado - Avenida Vilarinho DJ-105/25 · Execução de obra	Venda Nova	04/02/2026	17/06/2029	R$ 6 mi	R$ 721 mil	12%

continua

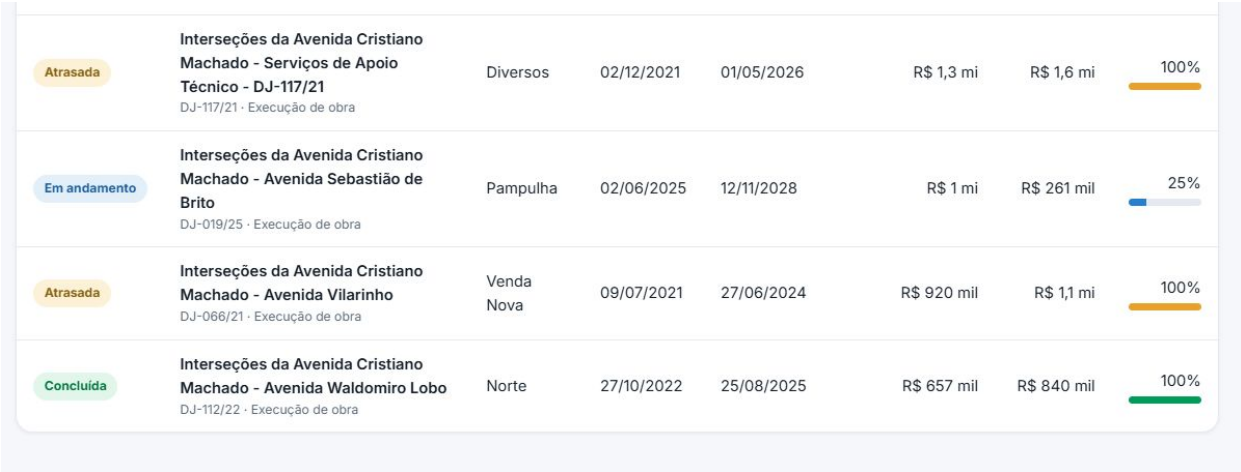

Atrasada	Interseções da Avenida Cristiano Machado - Serviços de Apoio Técnico - DJ-117/21 DJ-117/21 · Execução de obra	Diversos	02/12/2021	01/05/2026	R$ 1,3 mi	R$ 1,6 mi	100%
Em andamento	Interseções da Avenida Cristiano Machado - Avenida Sebastião de Brito DJ-019/25 · Execução de obra	Pampulha	02/06/2025	12/11/2028	R$ 1 mi	R$ 261 mil	25%
Atrasada	Interseções da Avenida Cristiano Machado - Avenida Vilarinho DJ-066/21 · Execução de obra	Venda Nova	09/07/2021	27/06/2024	R$ 920 mil	R$ 1,1 mi	100%
Concluída	Interseções da Avenida Cristiano Machado - Avenida Waldomiro Lobo DJ-112/22 · Execução de obra	Norte	27/10/2022	25/08/2025	R$ 657 mil	R$ 840 mil	100%

Fonte: BH em Obras - painel de obras públicas.

2. Legislação Correlata

Legislação Federal

- Constituição Federal de 1988 - *arts. 175 e 182;*
- Lei nº 10.257/2001 (Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências.) - *arts. 2º, 4º, 43, 44 e 45;*
- Lei nº 12.587/2012 (Institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana; revoga dispositivos dos Decretos-Leis nºs 3.326, de 3 de junho de 1941, e 5.405, de 13 de abril de 1943, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e das Leis nºs 5.917, de 10 de setembro de 1973, e 6.261, de 14 de novembro de 1975; e dá outras providências.) - *arts. 1º, 2º, 5º, 6º 7º, 14, 15, 21, 22, 23 e 24;*
- Lei nº 13.089/2015 (Institui o Estatuto da Metrópole, altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, e dá outras providências.) - *arts. 1º, 6º e 9º;*
- Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) - *arts. 11, 18 e 117.*

Legislação Municipal

- Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte - *arts. 12, XVI, 184, 185, 186, 188, II, 189, 193, §4, 196, 200, 201, 202, e 203;*
- Lei nº 10.134/2011 (Institui a Política Municipal de Mobilidade Urbana.) - *arts. 1º a 5º;*
- Lei nº 11.181/2019 (Aprova o Plano Diretor do Município de Belo Horizonte e dá outras providências.) - *Título XI, "Da Mobilidade Urbana" - arts. 291, 292, 293, 295, 296, 321,*
- Lei nº 11.319/2021 (Cria a Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte - Sumob - e dá outras providências.);
- Decreto nº 15.317/2013 (Institui o Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte - PlanMob-BH - e estabelece as diretrizes para o acompanhamento e o monitoramento de sua implementação, avaliação e revisão periódica.);
- Decreto nº 18.370/2023 (Dispõe sobre o controle, a gestão e a transparência do sistema de custeio da prestação de serviços de transporte público coletivo de passageiros por ônibus no Município.)

Belo Horizonte, 09 de novembro de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
LEILANE DE MOURA PAEGLE
Data: 09/11/2026 15:17:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Leilane de Moura Paegle
Consultora Legislativa em Política Urbana
Divisão de Consultoria Legislativa

Pedro Araújo Castro
Secção de Orçamento e Finanças Públicas
Divisão de Consultoria Legislativa

Pedro Schettini Cunha

Administrador
Divisão de Consultoria Legislativa

REFERÊNCIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE. BH em Obras – painel de obras públicas. Disponível em: https://obras.bhviral.com/ acesso em 22/10/2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE. Relatório Comparativo do Orçamento com Execução Sintético – até 2° Quadrimestre. Disponível em: https://prefeitura.pbh.gov.br/transparencia/contas-publicas/execucao-orcamentaria-e-gestao-fiscal/relatorio-comparativo-do-orcamento-2026 Acesso em 22/10/2026.

câmarapublicações

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Avenida dos Andradas 3100 . Santa Efigênia . BH . MG

www.cmbh.mg.gov.br

31 3555.1100
